



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA
RADA LUČKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA
2024. GODINU**

Predsjednik Upravnog vijeća



Željko Šoša, odgovajatelj predškolske djece

Ravnatelj:

Davor Škibola, dipl. Ing.

lipanj, 2025. godine

Na temelju članka 121. stavka 2. točke 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23), članka 21. Statuta Županijske lučke uprave Zadar, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, na 190. sjednici Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar održanoj dana 26. lipnja 2025. godine, podnosi:

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2024. GODINU

1. UVOD

1.1. USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije (a kasnije i Županijska skupština Zadarske županije), je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 6/11 i 16/15, 18/17, 9/19, 18/21 i 26/22) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje imenuje i razrješava izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, s time da predsjednika i dva člana izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave imenuje samostalno, jednog člana na prijedlog Ministarstva, a jednog na prijedlog svih jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze luke kojima upravlja županijska lučka uprava.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće temeljem javnog natječaja i zapisnika stručne komisije, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistemizacija) kojim se utvrđuje potreban broj stručno-tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.

1.2. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama te odlukom o Osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja. Temeljem članka 116. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) djelatnost županijske lučke uprave je upravljanje i korištenje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, a obavlja se kao javna djelatnost.

Djelatnosti županijske lučke uprave :

- 1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja*
- 2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje*
- 3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu*
- 4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila*
- 5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:*
 - a) privez i odvez plovnih i plutajućih objekata*
 - b) ukrcaj i iskrcaj tereta*
 - c) opskrba plovnih objekata vodom i energijom*
 - d) usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata u more*
 - e) lučko tegljenje i potiskivanje*
- 6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom*
- 7. osiguravanje opskrbe plovnih objekata gorivom*
- 8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području*
- 9. davanje koncesija i posebne upotrebe*
- 10. obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.*

Financiranje županijske lučke uprave propisano je člankom 123. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te su prihodi županijske lučke uprave:

- 1. lučke tarife*
- 2. prihodi od koncesije na lučkom području*
- 3. prihodi od posebne upotrebe na lučkom području*
- 4. sredstva iz proračuna osnivača*
- 5. sredstva iz državnog proračuna*
- 6. bespovratna sredstva iz strukturnih fondova Europske unije*
- 7. ostali prihodi u skladu s predmetnim Zakonom i općim aktima županijske lučke uprave*

Sredstvima iz točke 5. županijska lučka uprava može financirati samo izgradnju i održavanje lučke podgradnje, dok sredstva iz točaka 1. do 4., 6. i 7. pripadaju u cijelosti županijskoj lučkoj upravi na čijem području se ubiru i namijenjena su za: izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke, troškove poslovanja županijske lučke uprave.

Na financijsko poslovanje primjenjuje se Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14, 114/22) i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18, 134/22).

1.3. LUČKO PODRUČJE

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije („Narodne novine“ 7/21, 24/21) razvrstano je ukupno 116 luka otvorenih za javni promet, od čega su 3 luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, 8 luka od županijskog značaja i 105 luka od lokalnog značaja.

| LUKE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. luka Biograd – putnička luka | 5. luka Preko - putnička luka |
| 2. luka Brbinj Lučina – putnička luka | 6. luka Silba Žalić – putnička luka |
| 3. luka Fortica – putnička luka | 7. luka Tkon – putnička luka |
| 4. luka Pag – putnička luka | 8. luka Zaglav – putnička luka |

| LUKE LOKALNOG ZNAČAJA | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. luka Banj | 36. luka Novigrad | 71. luka Sv. Petar |
| 2. luka Barotul | 37. luka Olib | 72. luka Šimuni |
| 3. luka Bibinje – uvala Jaz | 38. luka Ošljak | 73. luka Škarda – uvala Trate |
| 4. luka Božava | 39. luka Pakoštane | 74. luka Telašćica – uvala Čušćica |
| 5. luka Brbinj – uvala Jaz | 40. luka Pakoštane – uvala Dugovača | 75. luka Telašćica – uvala Mir |
| 6. luka Brgulje | 41. luka Pašman | 76. luka Tribanj Kruščica |
| 7. luka Čeprljanda | 42. luka Petrčane | 77. luka Turanj |
| 8. luka Dinjiška | 43. luka Poljana | 78. luka Ugljan – Batalaža |
| 9. luka Dobropoljana | 44. luka Posedarje | 79. luka Ugljan – Kobiljak |
| 10. luka Doleška Draga | 45. luka Povljana | 80. luka Ugljan/Selo |
| 11. luka Dragove | 46. luka Preko | 81. luka Ugrinić |
| 12. luka Ist/Kosirača | 47. luka Premuda/Krijal | 82. luka Veli Rat |
| 13. luka Ist/Široka | 48. luka Premuda/Loza | 83. luka Verunić |
| 14. luka Iž Mali/Bržanj | 49. luka Pridraga | 84. luka Vinjerac |
| 15. luka Iž Mali/Knež | 50. luka Privlaka | 85. luka Vir – uvala Biskupnjača |
| 16. luka Iž Mali/Komoševo | 51. luka Privlaka – uvala Loznica | 86. luka Vir – uvala Lučica |
| 17. luka Iž Veli | 52. luka Proboj | 87. luka Vir – uvala Prezida |
| 18. luka Kali | 53. luka Rava Mala/Lokvina | 88. luka Vir – uvala Sapavac |
| 19. luka Kali – uvala Batalaža | 54. luka Rava Mala/Marinica | 89. luka Vir – uvala Slatinica |
| 20. luka Kali – uvala Mala Lamjana | 55. luka Ražanac | 90. luka Vir Luka |
| 21. luka Košljun | 56. luka Ražanac – uvala Plamići | 91. luka Vlašići |
| 22. luka Kožino – Primorje | 57. luka Rivanj | 92. luka Vrgada |
| 23. luka Kraj | 58. luka Rovanjaska | 93. luka Vrgada – uvala Sv. Andrija |
| 24. luka Kukljica | 59. luka Sali | 94. luka Vrsi – uvala Školjić |
| 25. luka Luka | 60. luka Savar | 95. luka Zadar/Bregdetti |
| 26. luka Lukoran | 61. luka Seline | 96. luka Zadar/ Diklo |
| 27. luka Ljubačka vala | 62. luka Sestrunj – uvala Hrvatini | 97. luka Zadar/Draženića |
| 28. luka Mandre | 63. luka Sestrunj/Kablin | 98. luka Zadar/ Foša |
| 29. luka Maslenica | 64. luka Sestrunj/Mul | 99. luka Zadar/Jazine |
| 30. luka Miškovići | 65. luka Smokvica | 100. luka Zadar/Maestral |
| 31. luka Molat / Lučina | 66. luka Soline | 101. luka Zapunte |
| 32. luka Mrljane | 67. luka Starigrad – Paklenica | 102. luka Zaton – uvala Dražnik |
| 33. luka Muline | 68. luka Sukošan | 103. luka Zverinac |
| 34. luka Neviđane | 69. luka Sutomišćica | 104. luka Ždrelac |
| 35. luka Nin | 70. luka Sv. Filip i Jakov | 105. luka Žman |

2. PRIHODI

Prihodi koje ostvaruje Županijska lučka uprava koriste se za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje, opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova, održavanje dubine u luci i na sidrištu luke, kao i za troškove poslovanja, a prikazani su u sljedećoj tablici.

| KONTO | PRIHODI | OSTVARENO 2023. | PLANIRANO 2024. | OSTVARENO 2024. | INDEKS | INDEKS |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(5/3)*100 | 7(5/4)*100 |
| 31 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA | 2.721.157,81 | 2.964.911,51 | 3.123.542,91 | 114,79 | 105,35 |
| 3111 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3112 | PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA | 2.721.157,81 | 2.964.911,51 | 3.123.542,91 | 114,79 | 105,35 |
| 31121 | LUČKE PRISTOJBE | 1.926.854,62 | 2.099.453,34 | 2.261.123,65 | 117,35 | 107,70 |
| | Pristojba za upotrebu obale | 696.780,07 | - | 754.704,83 | 108,30 | - |
| | Brodsko ležarina | 76.588,20 | - | 90.769,70 | 118,50 | - |
| | Pristojba za stalni komunalni vez | 453.477,83 | - | 636.426,64 | 140,30 | - |
| | Pristojba za vez u tranzitu na naut. dijelu luke | 406.552,38 | - | 533.718,58 | 131,20 | - |
| | Pristojba za vez u zimovanju | 293.456,14 | - | 245.503,90 | 83,60 | - |
| 31122 | LUČKE NAKNADE | 673.862,52 | 743.779,88 | 740.740,97 | 109,92 | 99,59 |
| | Usluge priveza i odveza | 631.487,03 | - | 678.991,00 | 107,50 | - |
| | Usluge opskrbe brodova slatkom vodom | 6.266,40 | - | 8.220,00 | 131,10 | - |
| | Usluge opskrbe brodova el. energijom | 16.884,40 | - | 32.767,60 | 194,00 | - |
| | Usluge istezališta | 17.979,69 | - | 19.720,37 | 109,60 | - |
| | Ostale naknade (odvoz i zbr. otpada, pokidan sustav mreže) | 1.245,00 | - | 1.042,00 | 83,60 | - |
| 31123 | NAKNADE ZA KONCESIJU | 120.440,67 | 114.733,29 | 114.733,29 | 95,26 | 100,00 |
| 31124 | OSTALI PRIHODI POSLOVANJA (prihodi od izdavanja dozvola na lučkom području) | 0,00 | 6.945,00 | 6.945,00 | - | 100,00 |
| 34 | PRIHODI OD IMOVINE | 1.043,37 | 210,52 | 232,25 | 22,26 | 110,32 |
| 341 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 1.043,37 | 210,52 | 232,25 | 22,26 | 110,32 |
| 3411 | PRIHODI OD KAMATA ZA DANE ZAJMOVE | 0,00 | 81,60 | 0,00 | - | - |
| 3412 | PRIHODI OD KAMATA PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA | 0,00 | 128,92 | 0,00 | - | - |
| 3413 | KAMATE NA OR. SREDSTVA I DEP. PO VIĐENJU | 1.043,37 | 0,00 | 103,33 | 9,90 | - |
| 3414 | PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 128,92 | - | - |
| 342 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3421 | PRIHODI OD ZAKUPA I NAJMA IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3422 | OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 35 | PRIHODI OD DONACIJA | 3.248.326,17 | 4.398.959,72 | 4.393.649,23 | 135,26 | 99,88 |
| 351 | PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA | 3.199.531,14 | 4.398.959,72 | 4.383.022,11 | 136,99 | 99,64 |
| 3511 | PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽ. PROR. RH | 1.485.880,97 | 1.788.225,30 | 1.788.225,30 | 120,35 | 100,00 |
| 3512 | PRIHODI OD DONACIJA JLPRS | 817.526,08 | 879.696,37 | 874.385,88 | 106,96 | 99,40 |
| 3513 | PRIHODI OD DONACIJA IZ DRŽ. PROR. ZA EU PROJEKTE | 896.124,09 | 1.731.038,05 | 1.720.410,93 | 191,98 | 99,39 |
| 352 | PRIHODI OD DONACIJA INOZ. VLADA I MEĐ. ORG. | 48.795,03 | 0,00 | 10.627,12 | 21,78 | - |
| 353 | PRIHODI OD TRG. DRUŠTAVA I OSTALIH PR. OSOBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 354 | PRIHODI OD GRAĐANA I KUĆANSTAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 355 | OSTALI PRIHODI OD DONACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 36 | OSTALI PRIHODI | 4.173,63 | 4.508,14 | 4.508,15 | 108,02 | 100,00 |
| 361 | PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA I REFUNDACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA RADA LUKA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR ZA 2024. GODINU

6

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 3611 | PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3612 | PRIHODI OD REFUNDACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 362 | PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 363 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 4.173,63 | 4.508,14 | 4.508,15 | 108,02 | 100,00 |
| 3631 | OTPIS OBVEZA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | - | - |
| 3632 | NAPLAĆENA DOSPJELA/OTPISANA POTRAŽIVANJA | 4.173,63 | 3.495,64 | 3.495,64 | 83,76 | 100,00 |
| 3633 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 0,00 | 1.012,50 | 1.012,50 | - | 100,00 |
| 3634 | PENALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | | 5.974.700,98 | 7.368.589,89 | 7.521.932,54 | 125,90 | 102,08 |
| 29 | ODGOĐENI PRIHODI OD DONACIJA | 7.157.097,45 | 2.931.086,24 | 2.901.813,58 | 40,54 | 99,00 |
| 29221/1 | DONACIJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.558.032,76 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 88,57 | 100,00 |
| | MMPI - LUKA BIOGRAD | 800.000,00 | - | 500.000,00 | 62,50 | - |
| | MMPI - LUKA RAŽANAC | 530.000,00 | - | 250.000,00 | 47,17 | - |
| | MMPI - LUKA NOVIGRAD | 80.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | MMPI - LUKA BIBINJE | 148.032,76 | - | 100.000,00 | 67,55 | - |
| | MMPI - LUKA MIŠKOVCI | 0,00 | - | 200.000,00 | - | - |
| | MMPI - LUKA NIN | 0,00 | - | 200.000,00 | - | - |
| | MMPI - LUKA PAŠMAN | 0,00 | - | 130.000,00 | - | - |
| 29221/2 | DONACIJE IZ PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE | 602.883,26 | 720.000,00 | 695.305,00 | 115,33 | 96,57 |
| | ŽŽ - LUKA NIN | 256.000,00 | - | 0,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA PAG | 43.084,00 | - | 0,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA BIOGRAD | 265.400,00 | - | 323.740,00 | 121,98 | - |
| | ŽŽ - LUKA PREKO | 21.899,26 | - | 0,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA MIŠKOVCI | 16.500,00 | - | 0,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA BIBINJE | 0,00 | - | 167.300,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA NOVIGRAD | 0,00 | - | 132.700,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA SALI (PROJ. DOK.) | 0,00 | - | 23.625,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA STARIGRAD (PROJ. DOK.) | 0,00 | - | 14.875,00 | - | - |
| | ŽŽ - LUKA DIKLO | 0,00 | - | 33.065,00 | - | - |
| 29221/3 | DONACIJE IZ PRORAČUNA JLS | 323.172,62 | 425.000,00 | 425.000,00 | 131,51 | 100,00 |
| | OPĆINA SUKOŠAN - LUKA SUKOŠAN | 57.727,00 | - | 0,00 | - | - |
| | OPĆINA SV. FILIP I JAKOV - LUKA SV. FILIP I JAKOV | 132.722,81 | - | 0,00 | - | - |
| | GRAD PAG - LUKA PAG | 132.722,81 | - | 0,00 | - | - |
| | OPĆINA RAŽANAC - LUKA RAŽANAC | 0,00 | - | 125.000,00 | - | - |
| | GRAD BIOGRAD - LUKA BIOGRAD | 0,00 | - | 200.000,00 | - | - |
| | GRAD NIN - LUKA NIN | 0,00 | - | 100.000,00 | - | - |
| 29221/P2 | EU PROJEKT DOGRADNJA LUKE SALI | 4.673.008,81 | 406.086,24 | 401.508,58 | 8,59 | 98,87 |
| SVEUKUPNO PRIHODI S ODGOĐENIM PRIHODIMA | | 13.131.798,43 | 10.299.676,13 | 10.423.746,12 | 79,38 | 101,20 |

U 2024. godini Županijska lučka uprava Zadar na temelju zakonskih ovlasti i zaključenih ugovora, ostvarila je prihode zajedno sa donacijama iz proračuna i prihoda od sučeljavanja troškova amortizacije u iznosu od 10.423.746,12 eura, što je 20,6 posto manje od ostvarenja u 2023. godini (prvenstveno zbog manje ostvarenih sredstava za provođenje EU projekta Dogradnje Luke Sali radi završetka istog) i 1,2 posto više od planiranih (prvenstveno zbog većeg ostvarenja prihoda od lučkih pristojbi).

Županijska lučka uprava Zadar u 2024. godini ostvarila je prihode od djelatnosti u iznosu od 7.521.932,54 eura, što je za 25,9 posto više nego što je ostvareno u 2023. godini. Rezultat boljeg ostvarenja prihoda ogleda se u sljedećim činjenicama:

- bolje ostvarenje prihoda od lučkih pristojbi (upotreba obale i pristojbi za vez) i naknada (uključivo prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti priveza i odveza, usluga istezališta i ostalo),
- bolje ostvarenje prihoda od donacija koje su rezultat priznavanja prihoda od donacija uslijed stavljanja u upotrebu novih ulaganja u lučku infrastrukturu što se prvenstveno odnosi na završetak projekata u Lukama Sali, Nin, Ražanac i Novigrad.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda od djelatnosti dan je u tablici ostvarenih prihoda za 2024. godinu.

Odgođeni prihod od donacije iz *Državnog proračuna RH* na iznos od 1.380.000,00 eura namjenska su sredstva za:

- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac“ u iznosu od 250.000,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija lukobranskog objekta gradske luke Biograd n/M“ u iznosu od 500.000,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija obalnog pojasa luke Bibinje“ u iznosu od 100.000,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija glave lukobrana u luci Miškovci na Pagu“ u iznosu od 200.000,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Uklanjanje naplavnog materijala u akvatoriju Ninske uvale u luci Nin“ u iznosu od 200.000,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija luke Pašman“ u iznosu od 130.000,00 eura.

Odgođeni prihod od donacije iz *proračuna Zadarske županije*, kao osnivača ustanove u iznosu od 695.305,00 eura, namjenska su sredstva a odnose se na sljedeće:

- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija lukobranskog objekta gradske luke Biograd n/M“ u iznosu od 323.740,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija obalnog pojasa luke Bibinje“ u iznosu od 167.300,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija dijela Rive i istezališta za brodove u luci Novigrad“ u iznosu od 132.700,00 eura,
- sufinanciranje radova na projektu „Sanacija dijela obalnog zida u luci Zadar/Diklo“ u iznosu od 33.065,00 eura,
- sufinanciranje projektne dokumentacije za „Sanaciju lukobrana u luci Sali“ u iznosu od 23.625,00 eura,
- sufinanciranje projektne dokumentacije za „Dogradnju luke Starigrad Paklenica“ u iznosu od 14.875,00 eura.

Odgođeni prihod od donacije iz *proračuna Grada Nina* u iznosu od 100.000,00 eura, namjenska su sredstva za sufinanciranje radova na projektu „Uklanjanje naplavnog materijala u akvatoriju Ninske uvale u luci Nin“.

Odgođeni prihod od donacije iz *proračuna Grada Biograda n/M* u iznosu od 200.000,00 eura, namjenska su sredstva za sufinanciranje radova na projektu „Sanacija lukobranskog objekta gradske luke Biograd n/M“.


Odgođeni prihod od donacije iz *proračuna Općine Ražanac* u iznosu od 125.000,00 eura, namjenska su sredstva za sufinanciranje radova na projektu „Sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac“.

Odgođeni prihod od donacije iz *Kohezijskog fonda* za EU projekte u iznosu od 401.508,58 eura, namjenska su sredstva za provedbu projekta „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku“.

Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji ostvareni u iznosu od 4.393.649,23 eura, prihodi su od donacija iz proteklih godina povezani sa nefinancijskom imovinom koja se amortizira i prizna u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine.

PRIHODI U 2024. GODINI


- 31 PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA
- 34 PRIHODI OD IMOVINE
- 35 PRIHODI OD DONACIJA
- 36 OSTALI PRIHODI
- 29221/1 DONACIJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
- 29221/2 DONACIJE IZ PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE
- 29221/3 DONACIJE IZ PRORAČUNA JLS
- 29221/P2 EU PROJEKT DOGRADNJA LUKE SALI



| NAZIV LUKE | BROJ UGOVORA | NAZIV LUKE | BROJ UGOVORA |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| BANJ | 42 | ČEPRLJANDA | 55 |
| BARTOUL | 30 | PREMUDA KRIJAL | 80 |
| BIOGRAD | 201 | PRIVLAKA | 295 |
| BOŽAVA | 40 | PRIVLAKA - UVALA LOZNICA | 142 |
| BRBINJ - UVALA JAZ | 19 | RAVA MALA - LOKVINA | 1 |
| ZADAR - BREGDETTI | 481 | RAŽANAC | 93 |
| BRGULJE | 40 | ROVANJSKA | 71 |
| ZADAR - DIKLO | 109 | RAŽANAC - UVALA PLAMIĆI | 70 |
| DOBROPOLJANA | 67 | SALI | 99 |
| DOLEŠKA DRAGA | 92 | SAVAR | 6 |
| PAKOŠTANE - UVALA DUGOVAČA | 113 | SELINE | 105 |
| DRAGOVE | 5 | SESTRUNJ - UVALA HRVATIN | 21 |
| ZADAR - DRAŽENICA | 98 | SESTRUNJ - KABLIN | 33 |
| ZADAR - FOŠA | 64 | SILBA MUL | 176 |
| ZADAR - JAZINE | 640 | SOLINE | 28 |
| KALI | 58 | STARIGRAD - PAKLENICA | 32 |
| KALI - UVALA BATALAŽA | 43 | SUKOŠAN | 186 |
| KALI - UVALA MALA LAMJANA | 52 | SUTOMIŠĆICA | 71 |
| KRAJ | 72 | SV. FILIP I JAKOV | 101 |
| KUKLJICA | 102 | ŠIMUNI | 148 |
| LUKA | 47 | TKON | 96 |
| LUKORAN | 101 | TRIBANJ KRUŠĆICA - UVALA LUBARDIĆ | 6 |
| LJUBAČKA VALA | 233 | TURANJ | 56 |
| ZADAR - MAESTRAL | 40 | UGLJAN - BATALAŽA | 72 |
| IŽ MALI - KOMOŠEVO | 36 | UGLJAN - KOBILJAK | 70 |
| MANDRE | 131 | UGLJAN SELO | 72 |
| MASLENICA | 40 | IŽ VELI | 176 |
| MRLJANE | 20 | VELI RAT | 38 |
| MULINE | 141 | VERUNIĆ | 23 |
| NEVIĐANE | 38 | VINJERAC | 135 |
| NIN | 76 | VIR - UVALA BISKUPNJAČA | 57 |
| NOVIGRAD | 156 | VIR - UVALA LUČICA | 7 |
| OLIB | 103 | VIR LUKA | 39 |
| OŠLJAK | 42 | VIR - UVALA SAPAVAC | 57 |
| PAG | 413 | VIR - UVALA SLATINICA | 64 |
| PAKOŠTANE | 5 | VRSI - UVALA ŠKOLJIĆ | 46 |
| PAŠMAN | 45 | ZAGLAV | 27 |
| PETRČANE | 139 | ZAPUNTEL | 6 |
| POLJANA | 88 | ŽDRELAC | 46 |
| PREKO | 161 | ŽMAN | 89 |
| SVEUKUPNO NA DATUM 31.12.2024. | | | 7418 |

3. RASHODI

Detaljni prikaz ostvarenih rashoda poslovanja dan je u izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske lučke uprave Zadar za 2024. godinu koji je sastavni dio izvršenja Programa rada. Struktura istih prikazana je u sljedećem grafikonu.

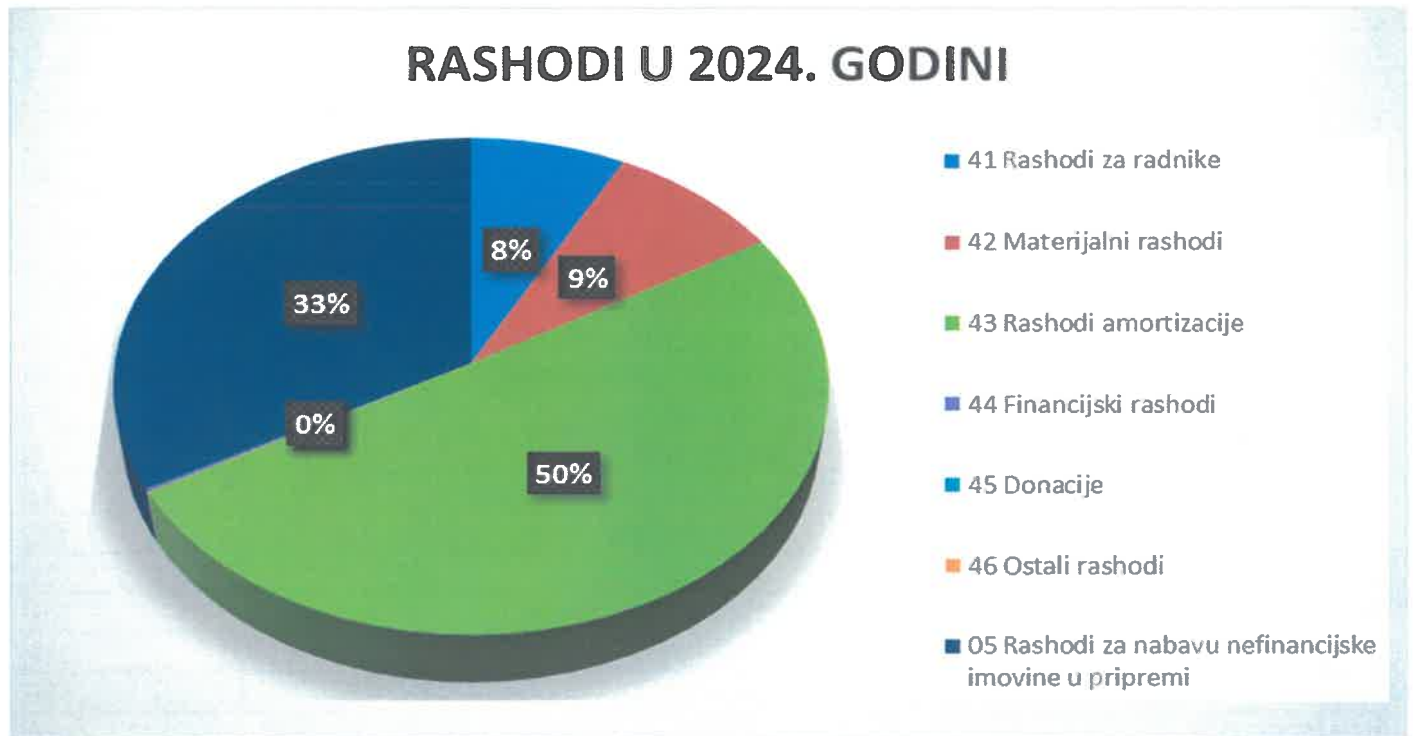

Iz grafikona se jasno iščitava kako se velika većina rashoda odnosi na investicije u dugotrajnu imovinu (čak 83 posto) od čega najviše na:

- rashode amortizacije u iznosu od 50 posto (otpisana vrijednost dugotrajne imovine),
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi u iznosu od 33 posto (ukupna nova ulaganja u tekuće projekte lučke infrastrukture u 2024. godini).

Ostvareni rashodi iskazuju se nastavno u tri programa:

1. Rashodi poslovanja
2. Rashodi održavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje
3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidžbe

| | |
|----------------------------------|---|
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: | <p>Unutarnje ustrojstvo Županijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave uređena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske lučke uprave Zadar.</p> <p>Županijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano 35 (trideset pet) radnih mjesta i sva radna mjesta su popunjena.</p> |
|----------------------------------|---|

| REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: | <p>Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadležna lučka uprava, planirana financijska sredstva u Financijskom planu za 2024. godinu iznose 7.149.620,11 eura, ostvarena su u iznosu od 7.215.156,91 eura i to kako slijedi:</p> | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | R.B. | NAZIV PROGRAMA | PLANIRANO 2024. | OSTVARENO 2024. | INDEKS 4/3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. | Rashodi za radnike (41) | 832.873,56 | 834.208,14 | 100,16 |
| | 2. | Materijalni rashodi (42) | 865.369,28 | 931.511,83 | 107,64 |
| | 3. | Rashodi amortizacije (43) | 5.429.669,75 | 5.426.442,65 | 99,94 |
| | 4. | Financijski rashodi (44) | 21.679,22 | 22.095,53 | 101,92 |
| | 5. | Ostali rashodi (46) | 28,30 | 898,76 | 3.175,83 |
| 6. | UKUPNO RASHODI | 7.149.620,11 | 7.215.156,91 | 100,92 | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA: | 3.1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI |
| SVRHA PROGRAMA: | Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone. |
| CILJ PROGRAMA: | Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadležnosti u području morskih luka. |
| REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: | <p>Program sadrži aktivnost i to:</p> <p>Rashodi ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobilježničke usluge, revizorske usluge, knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuču, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode.</p> <p>Uvođenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŽLU Zadar.</p> <p>Za provedbu programa financijskog plana planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.008.767,64 eura, ostvarena su u iznosu od 1.108.264,30 eura.</p> |
| NAZIV PROGRAMA: | 3.2. RASHODI ODRŽAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE |
| SVRHA PROGRAMA: | |

| | |
|-----------------------|--|
| CILJ PROGRAMA: | <p>Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o održavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luka.</p> |
| OPIS PROGRAMA: | <p>Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadležnosti lučkih uprava te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, održavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje.</p> <p>Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt – Održavanje i izgradnja lučke podgradnje • Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije <p>Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŽLU za razdoblje 2023.-2024.g.</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: | <p>Za provedbu programa u Financijskom planu za 2024. godinu planirana su financijska sredstva za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje te za snimak stanja i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 3.202.354,58 eura, ostvarena su u iznosu od 3.332.461,69 eura.</p> | | | | |
| | R.B. | NAZIV PROJEKTA/AKTIVNOSTI | PLANIRANO 2024. | OSTVARENO 2024. | INDEKS 4/3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. | <i>Projekt – Izgradnja i sanacija lučke podgradnje (0551)</i> | 3.116.158,91 | 3.200.611,69 | 102,70 |
| | 2. | <i>Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (0551)</i> | 86.195,67 | 131.850,00 | 152,90 |
| | 3. | UKUPNO PROGRAM | 3.202.354,58 | 3.332.461,69 | 104,00 |

U financijskom planu planirana financijska sredstva za održavanje lučke podgradnje u iznosu 6.140.852,47 eura koja se odnose na rashode: održavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko održavanje, održavanje lučkih svjetala, analize otpada, nadzor za održavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za održavanje lučke podgradnje, amortizacija, ostvarena su u iznosu od 6.106.892,61 eura (na amortizaciju otpada čak 88,3 posto ovih rashoda).

4. ZAVRŠENI PROJEKTI U 2024. GODINI

NAZIV PROJEKTA:


4.1. SANACIJA LUKOBRANSKOG OBJEKTA U LUCI BIOGRAD




| | |
|--|---|
| | <p>Projekti izgradnje i sanacije lučke podgradnje ostvareni u iznosu od 3.200.611,69 eura odnose se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radove na sanaciji lukobranskog objekta u luci Biograd u iznosu od 1.028.355,29 eura, • Radove na dijelu rive i istezališta u luci Novigrad u iznosu od 160.529,27 eura, • Radove na uklanjanju naplavnog sloja u luci Nin u iznosu od 492.875,01 eura, • Radove na sanaciji glave lukobrana u luci Miškovci na otoku Pagu u iznosu od 362.303,00 eura, • Radove na sanaciji glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac u iznosu od 490.911,37 eura, • Radove na sanaciji obalnog pojasa u luci Bibinje u iznosu od 400.193,21 eura, • Radove na sanaciji obalnog zida u luci Diklo u iznosu od 45.409,00 eura, • Radove na sanaciji luke Pašman u iznosu od 133.345,71 eura, • Radove u sklopu dovršetka EU projekta Dogradnje luke Sali u iznosu od 86.195,67 eura. |
|--|---|


| | |
|---|--|
| <p>REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:</p> | <p>Projektna dokumentacija za izgradnju i sanaciju lučke podgradnje ostvarena u iznosu od 131.850,00 eura odnosi se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hidrografski snimak dogradnje luke Sali u iznosu od 2.500,00 eura, • Projekt sanacije oštećenja dijela lukobrana u luci Poljana u iznosu od 7.821,00 eura, • Izmjenu i dopunu dokumentacije sanacije lukobranskog objekta u luci Biograd u iznosu od 3.125,00 eura, • Elaborat zaštite okoliša rekonstrukcije putničke luke Preko u iznosu od 5.000,00 eura, • Elaborat geotehničkog istraživanja putničke luke Preko u iznosu od 1.375,00 eura, • Elaborat zaštite okoliša i zaštite ekološke mreže luke Vrsi u iznosu od 9.147,50 eura, • Podmorski snimak stanja luke Ist u iznosu od 12.266,25 eura, • Dokumentacija o nabavi za projekt Dogradnje lučkog bazena Glavni gat u luci Vrsi u iznosu od 12.000,00 eura, • Projektna dokumentacija za prijavu projektnog prijedloga Dogradnje lučkog bazena Glavni gat u luci Vrsi u iznosu od 31.250,00 eura, • Izvedbeni projekt Rekonstrukcije gatova u Uvali Jaz u Biogradu u iznosu od 23.740,00 eura, • Izvedbeni projekt sanacije lukobrana u luci Sali u iznosu od 23.625,00 eura. |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p> | <p>Biograd na Moru– Radovi na sanaciji lukobranskog objekta luke Biograd započeli su krajem rujna 2023. godine, a isti su završeni u listopadu 2024. godine.</p> <p>Lukobran, čija je duljina približno 113 metara i tlocrtnog je oblika slova "L", suočavao se s ozbiljnim oštećenjima koja su ukazivala na narušenu stabilnost i nosivost. Tokom sanacije, izvedeni su radovi na demontiranju izvornih kamenih elemenata, koji su nakon čišćenja i uklanjanja nedostataka ponovo ugrađeni. Također, izvršeni su temeljni iskopi i izgrađeni novi podmorski i nadmorski obalni zidovi, dok je školjera dohranjena potrebnim obrambenim kamenom.</p> <p>Prilikom izvođenja radova na sanaciji lukobrana došlo je do izmjena tehničkog rješenja iz glavnog projekta. Naime, temeljni dio postojećeg parapeta, koji se trebao zadržati prema projektu, bio je u izrazito lošem stanju, što je bilo moguće utvrditi tek nakon izvršenog iskopa. Uslijed iskopa, došlo je do urušavanja zida, odnosno potrebe za rekonstrukcijom istog. Nakon demontiranja postojećih kamenih elemenata, ustanovljeno je da veliki dio njih nije prikladan za ponovnu ugradnju, kako je prvotno predviđeno projektom. Postavljeni su novi kameni elementi, a na naknadni zahtjev konzervatorskog odjela, visinska kota obale podignuta je za 30 cm.</p> <p>Sanacija lukobrana značajno je doprinijela poboljšanju vizure mjesta, čime je Biograd na Moru postao još atraktivnija destinacija za posjetitelje i lokalne stanovnike.</p> <p>Radovi su izvedeni u skladu s glavnim projektom izrađenim od strane projektanta Gorana Vege (Obala d.o.o.). Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Grada Biograda na Moru, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar.</p> |
| <p>ULAGANJE U 2024.G.:</p> | <p>1.028.355,29 eura s PDV-om</p> |
| <p>UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:</p> | <p>1.305.747,48 eura s PDV-om</p> |
| <p>IZVOĐAČ:</p> | <p>KALI GRADNJA d.o.o. P.I. KONZALTING d.o.o.</p> |

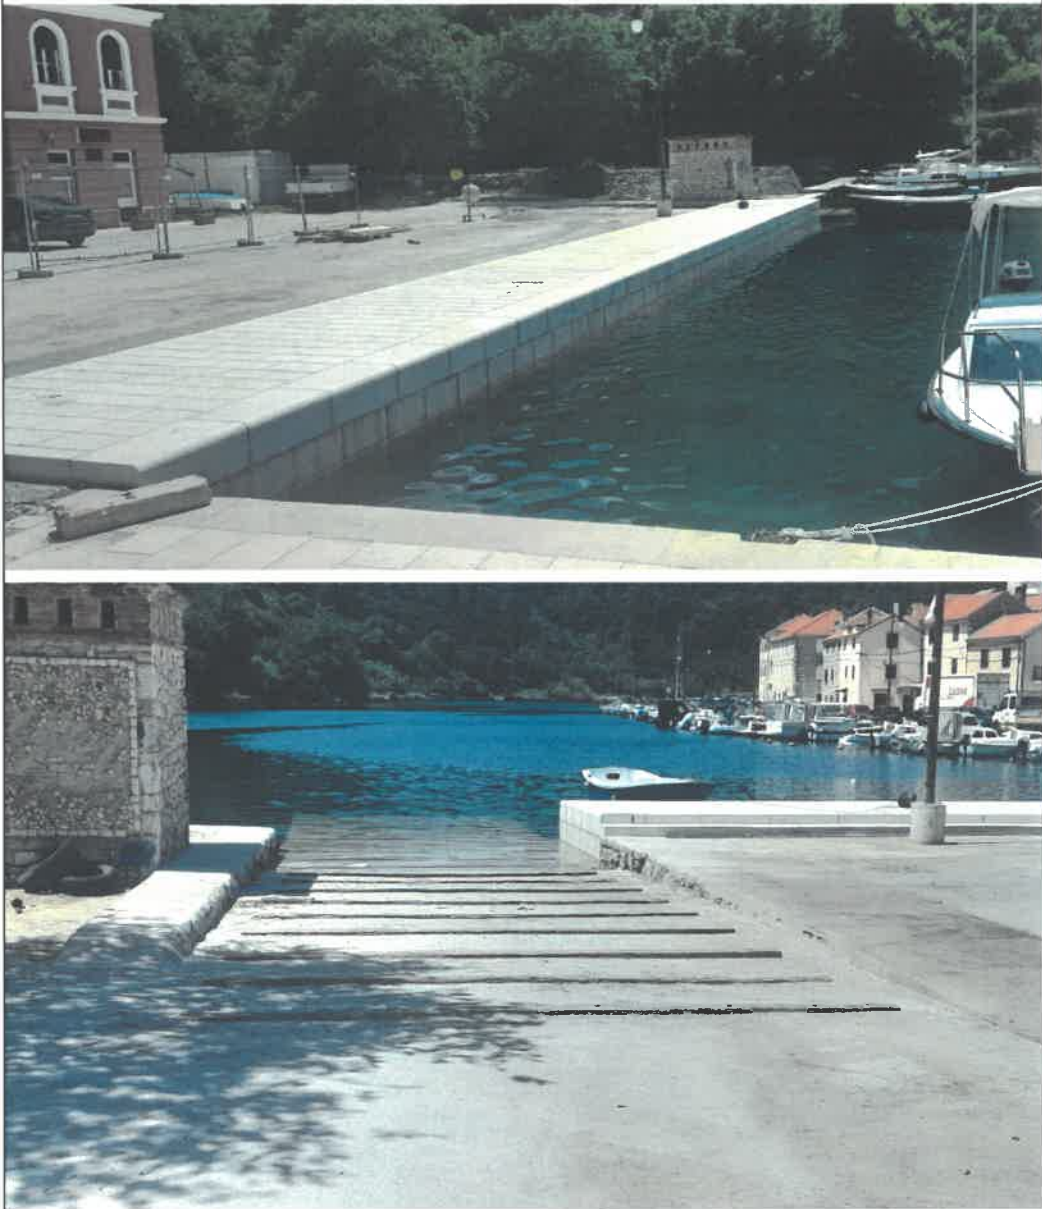
| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>NAZIV PROJEKTA:</p> | <p>4.2. IZVOĐENJE RADOVA NA DIJELU RIVE I ISTEZALIŠTA U LUCI NOVIGRAD</p>  |
| <p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p> | <p>Županijska lučka uprava Zadar završila je pomorsko-građevinske radove na sanaciji dijela rive i istezališta za brodove u luci Novi Grad. Sanacija je izvedena na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida na način da su postavljene kamene obloznice, kamene poklopnice i opločenje kamenom iznad nove betonske podloge.</p> <p>Radove je izvela zadarska tvrtka Stipčević d.o.o., a isti su sufinancirani od strane resornog ministarstva u iznosu od 80.000,00 eura.</p> <p>Usluga stručnog nadzora izvedena je od strane firme IN-STRIA d.o.o. Zagreb</p> |
| <p>ULAGANJE U 2024.G.:</p> | <p>160.529,27 eura s PDV-om</p> |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: | 192.259,67 eura s PDV-om |
| IZVOĐAČ: | STIPČEVIĆ d.o.o., IN STRIA d.o.o. |

| | |
|-----------------------------|---|
| NAZIV PROJEKTA: | <p>4.3. UKLANJANJE NAPLAVNOG SLOJA MATERIJALA U AKVATORIJU U LUCI NIN</p>  |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: | <p>Grad Nin i Županijska lučka uprava Zadar uspješno su realizirali projekt uklanjanja naplavnog sloja materijala u akvatoriju Ninske uvale, čime je uvala vraćena u svoju djelomičnu funkcionalnost. Radovi su trajali sedam mjeseci, tijekom kojih je iskopano 18.060,00 m³ naplavnog materijala, čime je osigurana sigurnost, manevriranje plovila i nesmetano korištenje vezova u luci.</p> <p>Radove je izvodila tvrtka Kali gradnja d.o.o. iz Kali, dok je stručni nadzor obavljala tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke. Nadzorni inženjer bio je Andrej Humski mag. ing. aedif., a projekt refuliranja izradio je Kruno Fafandžel, dipl. ing. građ., iz iste tvrtke.</p> <p>Podsjećamo, dana 11. rujna 2017. godine, Ninsku uvalu zahvatila je velika poplava koja je nanijela ogromne količine naplavnog materijala i značajno ugrozila funkcionalnost luke. Izvedenim radovima otklonjeni su ti problemi te je uvala ponovno u službi svih korisnika. Ovaj projekt ključan je za očuvanje i razvoj pomorskog prometa, kao i za sigurnost svih koji koriste Ninsku luku.</p> |
| ULAGANJE U 2024.G.: | 492.875,01 eura s PDV-om |
| UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: | 493.125,00 eura s PDV-om |
| IZVOĐAČ: | KALI GRADNJA d.o.o., RIJEKA PROJEKT d.o.o. |


| | |
|---|---|
| <p>NAZIV PROJEKTA:</p> | <p>4.4. SANACIJA OŠTEĆENJA GLAVE LUKOBRANA U LUCI MIŠKOVCI U MIŠKOVIĆIMA NA OTOKU PAGU</p>  |
| <p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p> | <p>Završena sanacija glave nasutog lukobrana – povećana sigurnost i očuvana funkcionalnost privezišta. Osigurana stabilnost konstrukcije i očuvana sigurnost pomorskog prometa u tom dijelu lučkog područja. Radovi su trajali od veljače do listopada 2024. godine. Sanacija je bila nužna iz razloga amortiziranja destabilizacije kamenih blokova uslijed dugotrajnog djelovanja valova, što je djelovalo na manju funkcionalnost lukobrana. Sanacija se izvela uz maksimalno očuvanje postojeće linije obale, vodeći računa o zadržavanju dubine mora ispred novog zida, u skladu s potrebama privezivanja plovila svih kategorija.</p> |
| <p>ULAGANJE U 2024.G.</p> | <p>362.303,00 eura s PDV-om</p> |
| <p>UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:</p> | <p>362.223,00 eura s PDV-om</p> |
| <p>IZVOĐAČ:</p> | <p>SUBMISSION j.d.o.o.</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>NAZIV PROJEKTA:</p> | <p>4.5. SANACIJA GLAVNOG LUKOBRAHA I GATA U LUCI RAŽANAC</p>   |
| <p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p> | <p>Nakon mjeseci intenzivnih radova, završena je sanacija glavnog lukobrana i gata u luci Ražanac. Ovaj značajan projekt, koji obuhvaća dio rive uz prometnicu te 75 metara dug lukobran i 30 metara dug gat, sad nudi ugodno mjesto za šetnju i druženje uz more, pružajući dodatnu sigurnost za plovila lokalnog stanovništva.</p> <p>Sanacija je bila neophodna zbog izloženosti luke jakim burama i valovanju, što je kroz vrijeme uzrokovalo značajna oštećenja. Problematična područja uključivala su podmorski zid, gdje je nastalo niz podlokavanja i kaverni, kao kameni nadmorski dio, poklopnice, kameno popločanje partera te parapetni zid izgrađen od kamena. U ranijim zahvatima glavni mul i dio gata dobili su betonsku završnu podlogu, koja je sad zamijenjena izvornim kamenim pločama, vraćajući im autentičan izgled.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Hodna ploča uz sam rub lokalne prometnice sanirana ja na način da se uklonila ispucala betonska površina te je izvedena nova betonska ploča prosječne debljine 20 cm koja se povezala s postojećom pločom putem perfo- sidra.</p> <p>Izvođač radova bila je zajednica ponuditelja Stipčević d.o.o. Zadar i Kali gradnja d.o.o. Kali., dok je projekt napravio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak.</p> |
| <p>ULAGANJE U 2024.G.</p> | <p>490.911,37 eura s PDV-om</p> |
| <p>UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:</p> | <p>1.034.460,05 eura s PDV-om</p> |
| <p>IZVOĐAČ:</p> | <p>STIPČEVIĆ d.o.o., KALI GRADNJA d.o.o.</p> |
| <p>NAZIV PROJEKTA:</p> | <p>4.6. SANACIJA OBALNOG POJASA LUKE BIBINJE</p>  |

| | |
|---|--|
| <p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p> | <p>Završetkom opsežnih radova u studenom 2024. godine, luka Bibinje – uvala Jaz dobila je novu, moderniziranu obalnu infrastrukturu. Ovaj značajan infrastrukturni projekt obuhvatio je obnovu dijelova glavnog i sekundarnog lukobrana, te jugozapadnog obalnog zida, čime je postignut višestruki cilj: povećanje sigurnosti, stabilnosti i estetskog dojma luke.</p> <p>Glavni lukobran prošao je temeljitu sanaciju u podmorskom i nadmorskom dijelu. U podmorskom dijelu, dužine 42 m, postavljena je nova betonska obloga koja osigurava čvrstoću i dugovječnost konstrukcije. Ispred betonske obloge postavljeni su "blokovi čuvari" dimenzija 35x25 cm, koji su zatrpani s materijalom temeljnog nasipa. U nadmorskom dijelu izvedena je nova armiranobetonska (AB) ploča, a uz rubove su postavljene kamene poklopnice. Također, saniran je obrambeni kamenomet, a postavljeni su i proturni kanali za instalaciju solarne rasvjete. Na navedenu konstrukciju postavljena je solarna rasvjeta, čime se osigurava ekološki prihvatljivo i energetski učinkovito osvjetljavanje luke.</p> <p>Sekundarni lukobran saniran je na ključnim točkama. U podmorskom dijelu ugrađena je nova betonska obloga te je zamijenjena AB ploča kanala za cirkulaciju u podmorskom dijelu lukobrana, dok su na nadmorskom dijelu ugrađene kamene poklopnice i betonska obloga u skladu s novim estetskim smjericama. Duž obale ispod poklopnica ugrađeni su prstenovi za privez na razmaku od 2,5 m, dok su na glavi lukobrana ugrađene bitve za privez nosivosti 30 tona. U sklopu sanacije sekundarnog lukobrana, izvedena je i sanacija kolne površine, koja je uključivala uklanjanje betonske površine, popunjavanje s tucanikom i ugradnju betonskih opločnika.</p> <p>Obalni zid također je prošao opsežnu sanaciju, koja je obuhvatila podmorski i nadmorski dio istog. Na podmorskom dijelu ugrađena je nova betonska obloga do postojećeg betonskog gata pri čemu je obuhvaćen pojas betonskog opločnika parkinga, koji je bio ulegnut. Izrađen je novi pomorski zid širine 120 cm, iza kojeg je ugrađen kameni nasip. Nadmorski dio obalnog zida izveden je od lomljenog kamena, a za oblogu su se koristili deponirani elementi kamena, koji je mjestimično nadopunjen novim elementima. Svi radovi izvedeni su u skladu s visokim ekološkim standardima te obalu krase novo dekorativno uređenje, uključujući betonske ploče i kamene obloge.</p> <p>Projekt sanacije, sufinanciran je sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zadarske županije te Županijske lučke uprave Zadar. Radove je izvodila tvrtka Minigradnja d.o.o. iz Vodica, dok je glavni projekt izradio dr. sc. Goran Vega, dipl. ing. građevine, iz tvrtke Obala d.o.o</p> |
| <p>ULAGANJE U 2024.G.</p> | <p>400.193,21 eura s PDV-om</p> |
| <p>UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:</p> | <p>536.670,96 eura s PDV-om</p> |
| <p>IZVOĐAČ:</p> | <p>MINIGRADNJA d.o.o.</p> |

| 5. PROJEKTI U IZGRADNJI | |
|------------------------------------|---|
| NAZIV PROJEKTA: | <p>5.1. SANACIJA DIJELA OBALNOG ZIDA U LUCI DIKLO</p>  |
| KRATKI OPIS PROJEKTA: | <p>U mjesnoj lučici Diklo započeti su radovi na sanaciji dijela obalnog zida u listopadu 2024. godine. Radovi su obuhvaćali sanaciju postojećeg stanja oštećenog zida, s ciljem njegove stabilizacije i dugoročnog očuvanja.</p> <p>Izvođač radova bila je zadarska tvrtka Stipčević d.o.o., dok je projekt izradio ovlaštenu inženjer građevinarstva Željko Čirjak, dipl. ing. građ. Stručni nadzor provodio je inženjer Igor Pukec, dipl. ing. građ., a cjelokupni tijek radova nadgledan je i od strane Konzervatorskog odjela u Zadru, s obzirom na vrijednost i osjetljivost prostora.</p> |
| ULAGANJE U 2024.G. | 45.409,00 eura s PDV-om |
| UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: | 113.918,25 eura s PDV-om |
| IZVOĐAČ RADOVA: | STIPČEVIĆ d.o.o. |

| | |
|---|---|
| <p>NAZIV PROJEKTA:</p> | <p>5.2. SANACIJA LUKE PAŠMAN</p>  |
| <p>KRATKI OPIS PROJEKTA:</p> | <p>Započeli su radovi na sanaciji luke Pašman u listopadu 2024. godine. Izvođač radova bila je tvrtka Sub mission j.d.o.o., sa sjedištem u Zadru, dok je projekt sanacije izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željka Čirjaka, dipl. ing. građ., koji je ujedno obnašao i ulogu nadzornog inženjera na terenu.</p> <p>Projekt sanacije sufinanciran je sredstvima Zadarske županije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Županijske lučke uprave Zadar, što pokazuje zajedničku predanost lokalne i državne razine u očuvanju i razvoju obalne infrastrukture.</p> <p>Sanacija obuhvaća poprečne gatove i dio obalnog zida, koji su s vremenom pretrpjeli oštećenja uzrokovana djelovanjem mora i uporabnim opterećenjima. Posebno se ističe dio obalnog zida glavnog lukobrana, izveden kao betonska konstrukcija, koji zahtijeva sanaciju zbog podlokavanja, kaverni te oštećenja nastalih na plombama iz prethodnih sanacija. Ta su oštećenja bila rezultat abrazivnog djelovanja morskih struja i valova, osobito na podmorskim dijelovima zida u kontaktu s morskim dnom.</p> |
| <p>ULAGANJE U 2024.G.</p> | <p>133.345,71 eura s PDV-om</p> |
| <p>UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:</p> | <p>241.607,46 eura s PDV-om</p> |
| <p>IZVOĐAČ:</p> | <p>SUBMISSION j.d.o.o.</p> |

| 6. OSTALA ULAGANJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR U 2024. GODINI | |
|---|--|
| SIGURNOST U LUCI: | POSTAVLJANJE BOKOŠTITNIKA U LUKAMA: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Postavljanje bokobrana u luci Zaglav 23.521,25 eura, • Postavljanje bokobrana u luci Tkon 28.087,50 eura, • Postavljanje bokobrana u luci Olib 31.132,50 eura, • Postavljanje bokobrana u luci Premuda 36.937,50 eura, • Sanacija bokobrana u luci Brbinj 1.976,25 eura. |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: | 121.655,00 eura |
| ODRŽAVANJE LUKE: | POSTAVLJANJE SIDRENOG SUSTAVA, MURING, BITVI U LUKAMA |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sidreni blokovi i konopci u luci Veli Iž 13.462,50 eura, • Čelične bitve u luci Silba 8.312,50 eura, • Pregled i snimak sidrišta u luci Pag 2.000,00 eura, • Postavljanje sidrenih stupova u luci Preko 1.009,13 eura, • Postavljanje sidrenih stupova u luci Vir 1.609,38 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Božava 2.593,75 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Brbinj 1.775,00 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Brgulje 1.400,00 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Olib 2.159,38 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Luka (Dugi otok) 320,31 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Žman 481,25 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Drage Dugovača 8.886,00 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Sukošan 1.456,25 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Sali 17.150,00 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Drage 321,88 eura, • Sanacija i popravak rampe u luci Biograd 4.750,00 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Biograd 45.854,09 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Nin 32.005,00 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Silba 8.868,75 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Jazine 3.945,00 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Nin 4.368,75 eura, • Ulaganja u sidreni sustav u luci Telašćica 1.162,50 eura. |
| UKUPNA VRIJEDNOST: | 163.891,42 eura |
| ODRŽAVANJE LUKE: | IZRADA, DOPREMA I UGRADNJA (NUMERACIJA) VEZOVA U LUKAMA: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Numeriranje i postavljanje brojeva u luci Kukljica 1.174,50 eura, • Numeriranje i postavljanje brojeva u luci Tkon 211,50 eura, • Numeriranje i postavljanje brojeva u luci Bibinje 1.314,00 eura, • Numeriranje i postavljanje brojeva u luci Ražanac 360,00 eura. |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: | 3.060,00 eura |

| | |
|---------------------------|--|
| ODRŽAVANJE LUKE | <p>POSTAVLJENA SOLARNA RASVJETA U LUKAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaža rasvjetnog stupa u luci Preko 1.468,84 eura, • Montaža solarne rasvjete u luci Petrčane 7.263,60 eura, • Montaža solarne rasvjete u luci Bibinje 8.684,06 eura, • Montaža solarne rasvjete u luci Miškovci 5.447,70 eura. |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: | 22.864,20 eura |
| ODRŽAVANJE LUKE | <p>OSTALI POPRAVCI U LUKAMA</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ugradnja aluminijskih vrata u luci Preko 1.512,50 eura, • Saniranje kamenih ploča na rivi u luci Petrčane 3.312,50 eura, • Elektroinstalacijski radovi u luci Drage Dugovača 2.318,75 eura, • Popravci signalizacije u luci Biograd 1.833,75 eura, • Popravci signalizacije u luci Tkon 7.411,25 eura, • Elektroinstalacijski radovi u luci Sukošan 2.460,00 eura, • Snimak stanja u luci Ražanac 300,00 eura, • Snimak konstrukcije u luci Premuda i Olib 27.375,00 eura, • Tekuće i investicijsko održavanje objekata pomorske signalizacije 100.030,00 eura, • Popravak kolica za transport na istezalištu u Jazinama 1.100,00 eura, • Montaža inox ljestvi u luci Drage 9.375,00 eura, • Izrada detaljnih geodetskih podloga za luke ŽLU 28.625,00 eura, • Popravak mula u luci Draženica 3.750,00 eura, • Postavljanje tabli u luci Nin 1.412,50 eura, • Postavljanje tabli i info panela u luci Sali 3.812,50 eura, • Popravak klupa u luci Jazine 6.750,00 eura, • Izrada panela u luci Jazine 987,50 eura, • Hidrografski elaborati u lukama Brbinj, Molat, Olib, Premuda, Zaglav 31.057,13 eura. |
| UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: | 233.423,38 eura |

KLASA: 400-01/25-01/02

URBROJ: 2198-01-87/4-25-1

U Zadru, 26.06.2025. godine

RAVNATELJ
 Davor Škibola, dipl. ing.



